

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 01

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (w trzech częściach)

Kontrakt nr 01/I/2006

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”

Realizacja części I Kontraktu została zakończona. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia dla robót w terminie umownym na dzień 02.04.2009r. Wykonawca prowadził próbną eksploatację i optymalizuje proces w celu osiągnięcia zakładanych efektów technologicznych.
Stopień zaawansowania kontraktu - ca 99%.




Nowy osadnik wtórny

Kontrakt nr 01/II/2006

„Budowa głównego kolektora ściekowego”

Realizacja części II Kontraktu przebiega niezgodnie z harmonogramem. Opóźnienia dotyczą zarówno projektowania i realizacji robót na odcinkach - dla których zostały już uzyskane pozwolenia na budowę i przekazane zostały place budowy. Uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich etapów robót obejmujących kontrakt. Zakończono prace związane z wykonywaniem projektów wykonawczych. Na ukończeniu są prace związane z wyposażeniem pompowni ścieków (zamontowano: kraty, zastawki, koryta wywrotne, krawędź przelewową, podstawy pod pompy) i budynku trafostacji (zamontowano m.in. rozdzielnię SN oraz agregat prądotwórczy). Zakończono prace przy wykonywaniu kolektora grawitacyjnego DN 2000. Zakończono prace przy budowie kolektora tłoczego do oczyszczalni ścieków. Do wykonania pozostało wykonanie spinek nowego kolektora tłoczego z istniejącym. Obecnie wykonywane jest wyposażenie technologiczne komór połączeniowych. Zakończono roboty przy komorach do rurociągów obejściowych oraz przy komorze połączeniowej kolektorów A i D wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zakończono roboty przy wylocie burzowca do rzeki Słupi. Trwają prace przy rozruchu urządzeń oraz uruchamianiu systemu automatyki. Wykonywane jest odtworzenie terenu wokół pompowni w zakresie wykonywanych robót.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 90%.

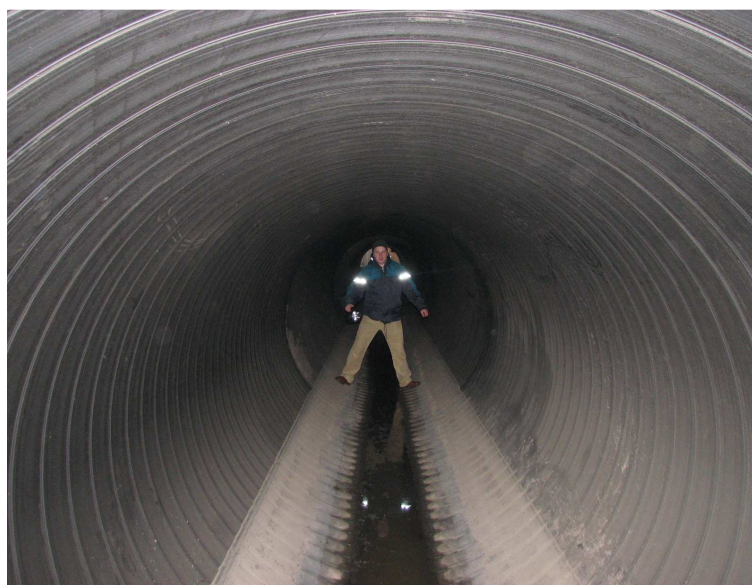

Kanał o średnicy 2 metrów odprowadzający ścieki z miasta do wybudowanej przepompowni ścieków na terenie bazy głównej „Wodociągów Słupsk” przy ul. Orzeszkowej 1.

Kontrakt nr 01/III/2006

„Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”

Realizacja części III Kontraktu przebiega z opóźnieniem. Termin zakończenia kontraktu minął na początku grudnia 2008. Pierwotnie Wykonawca deklarował, że roboty zakończone zostaną pierwszej połowie 2009. Jednak termin ten znowu się przesunął i zakończenie robót nastąpiło w drugiej połowie września 2009. Wykonawca opracował dokumentację powykonawczą do świadectwa przejęcia dla części wykonanych już robót na ul. Cecorskiej, Sułkowskiego oraz przekazał do weryfikacji dokumentację na zakończone odcinki robót w dzielnicy Podgrodzie (ul. Kilińskiego, Partyzantów, Kaszubska, Podgórna, Długosza, Armii Krajowej, Sądowa, Szarych Szeregów). Trwa rozruch podczyszczalni wód opadowych przy ul. Krakusa. Wykonawca do zakończenia prac rozruchowych (październik) ma przekazać wyniki badań. Trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczych i sprawdzenia zgodności wykonanych robót. Stopień zaawansowania kontraktu - ca 99 %.
