



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

„GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI SŁUPSK”

Umowa o dofinansowanie nr **POIS.01.01-00-00-106/13 ze zmianami**

Andrzej Mielczarek
Kierownik Działu Inwestycji
V-ce MAO dla Projektu

GŁÓWNE INWESTYCJE - STATUS REALIZACYJNY I BUDŻETY

PRZYSZŁOŚĆ

30.05.2014 r.

23.12.2014 r.

02.07.2015r.

24.09.2015r.

Czerwiec 2016 r.

BUDŻET PIERWOTNY
23 968 533,50

BUDŻET
36 809 558,84

BUDŻET
49 139 989,88

BUDŻET OSTATECZNY
48 615 327,11

Umowa zasadnicza

Rozbudowa oczyszczalni ścieków -12 286 683,41 zł

Zakup sita do kompostu - **825 000,00 zł**

Zakup ładowarki - **424 500,00 zł**

Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja z miejscowości Kobylnica do sieci kanalizacji grawitacyjnej w Słupsku w ul. Grottgera - **340 000,00 zł**

Kanalizacja w ul. Chełmońskiego w Słupsku - **133 345,97 zł**

Nadzory inwestorskie w branży budowlanej i elektrycznej - **75 400,00 zł**

I Aneks do UoD

Zaprojektowanie i budowa instalacji SOWA - **1 360 000,00 zł**

Projekt "Ringu kanalizacyjnego Słupska" - **145 700,00 zł**

Projekt „Przepompowni ścieków przy ul. Borchardta” - **29 701,50 zł**

Budowa „Ringu Kanalizacyjnego Słupska” - II Etapy - **12 961 844,19 zł**

Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Borchardta - **1 106 217,54 zł**

Włączenie Partnera -
GMINA SŁUPSK

II Aneks do UoD

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej - **627 132,82 zł**

Budowa sieci wodociągowych w ul. Szczecińskiej - ul. Sobieskiego - **548 638,54 zł**

Budowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej - **89 600,00 zł**

Przebudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Szczecińskiej - **77 707,56 zł**

Budowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I - **138 528,34 zł**

SUW w miejscowości Bierkowo - **1 433 773,81 zł**

SUW w miejscowości Głobino - **1 712 000,00 zł**

SUW w miejscowości Strzelino - **2 027 000,00 zł**

SUW w miejscowości Swochowo - **2 355 000,00 zł**


III Aneks do UoD

Zakończenia robót: **do 31.03.2016r.**

Rozliczenie inwestycji: **do 30.05.2016r.**

Rozliczenie Projektu: **do 30.06.2016r.**

Kalendarium realizacyjne

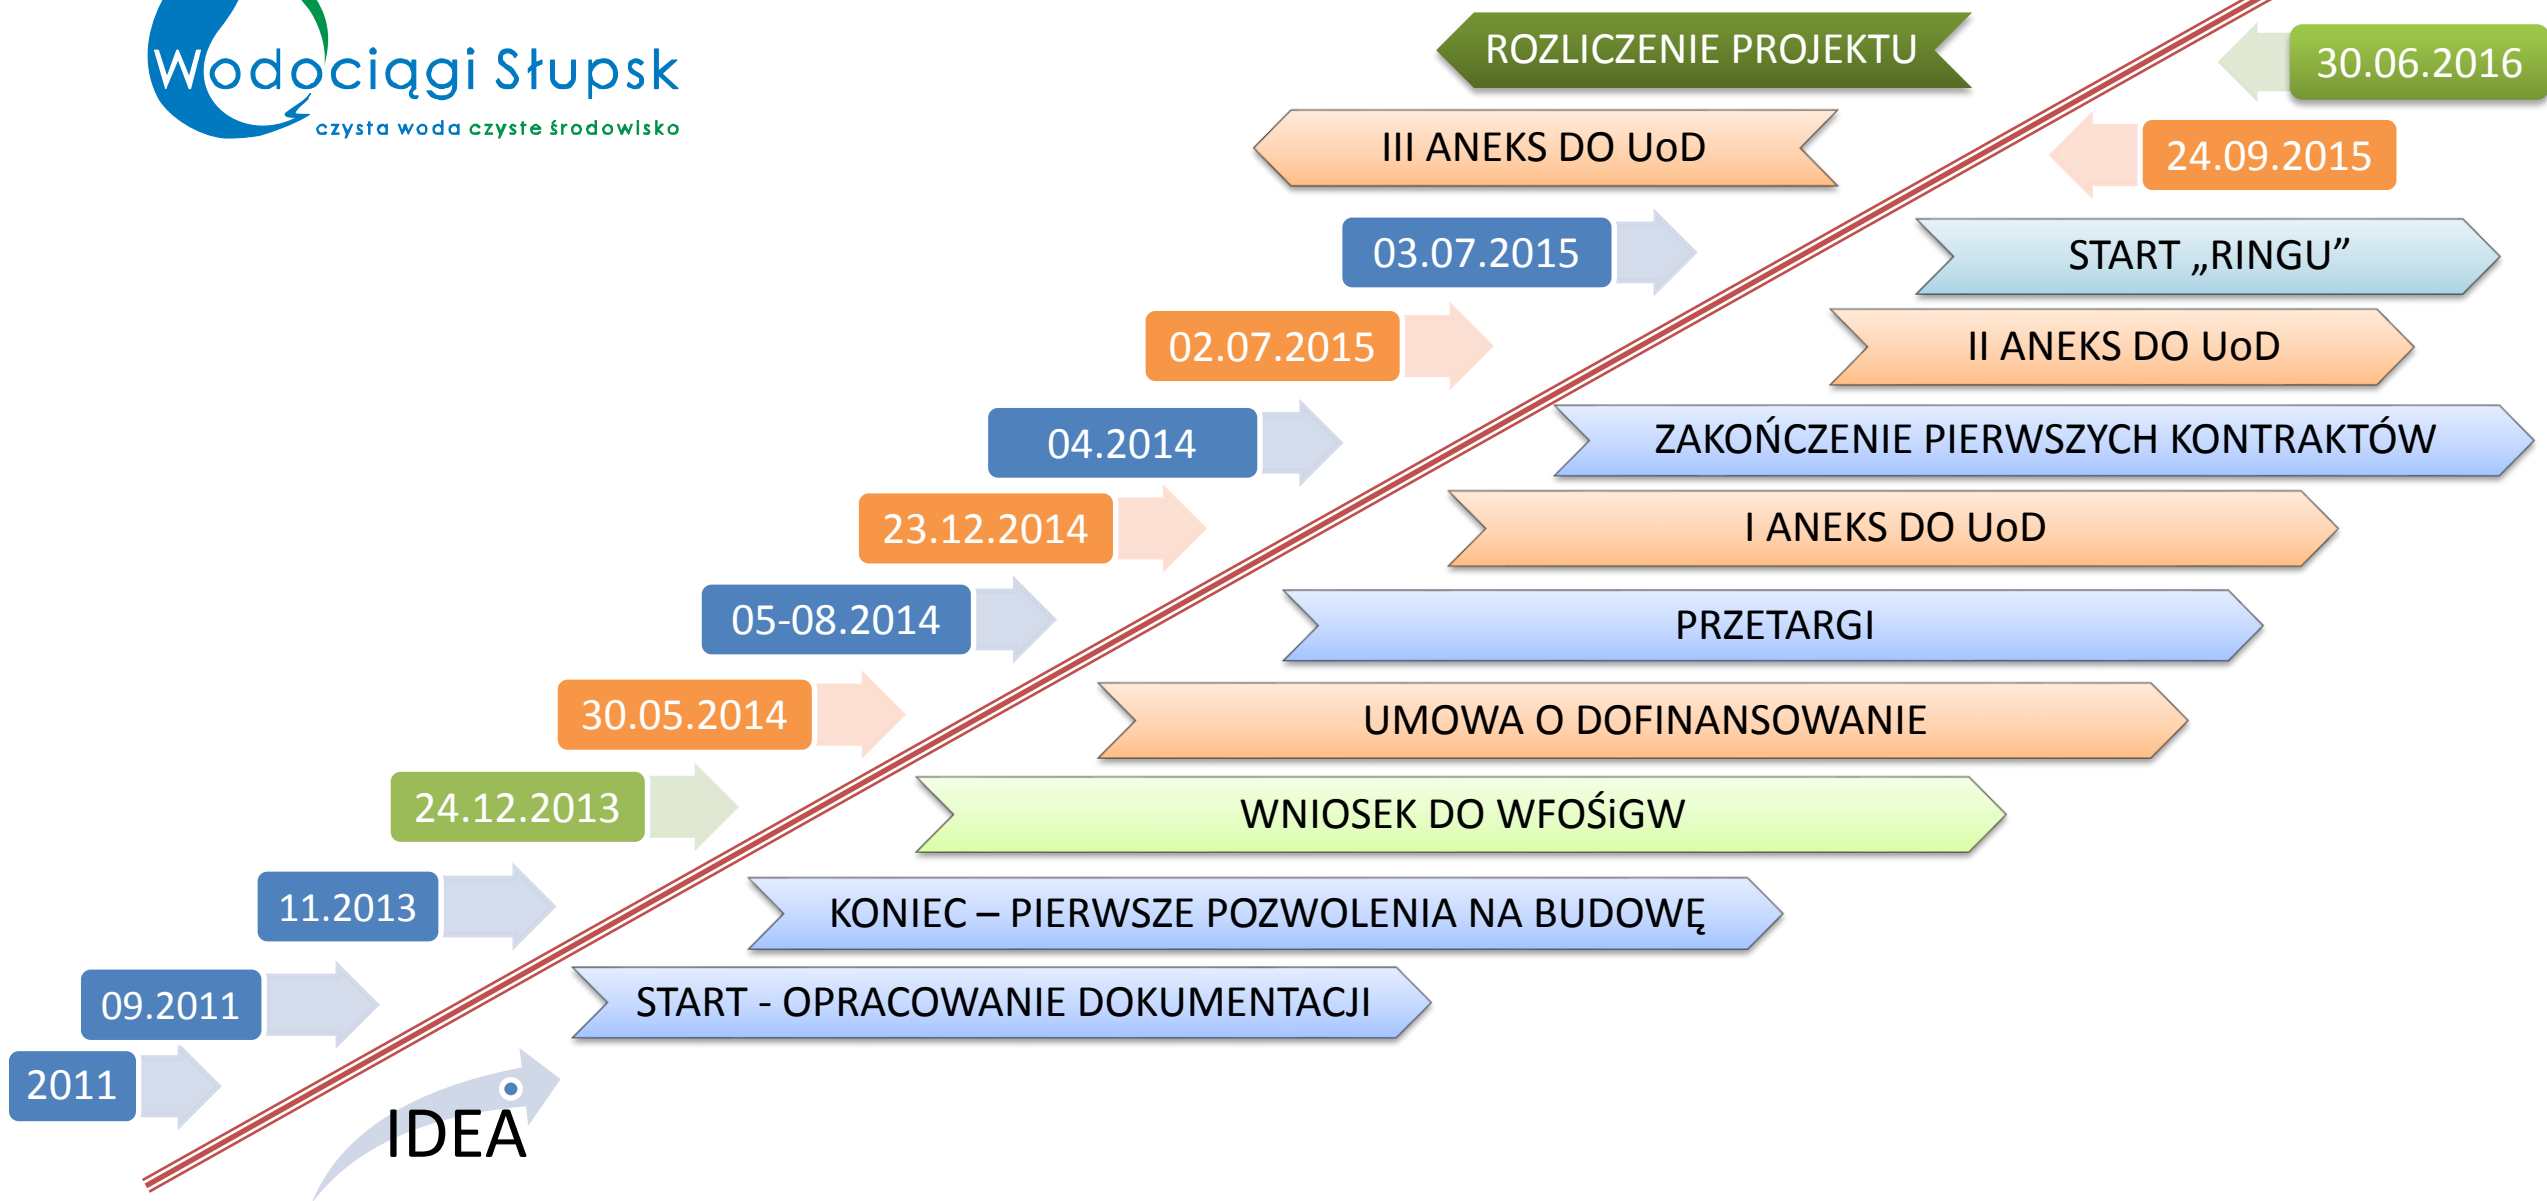



PROGNOZA BUDŻETOWANIA PROJEKTU POIŚ

symulacje na temat udziałów w budżecie całkowitym Projektu

PRZYKŁAD DOBREJ PARTYCYPACJI MIĘDZYGMINNEJ

Koszt Projektu– 48 615 327,11zł

Założenia główne budżetu

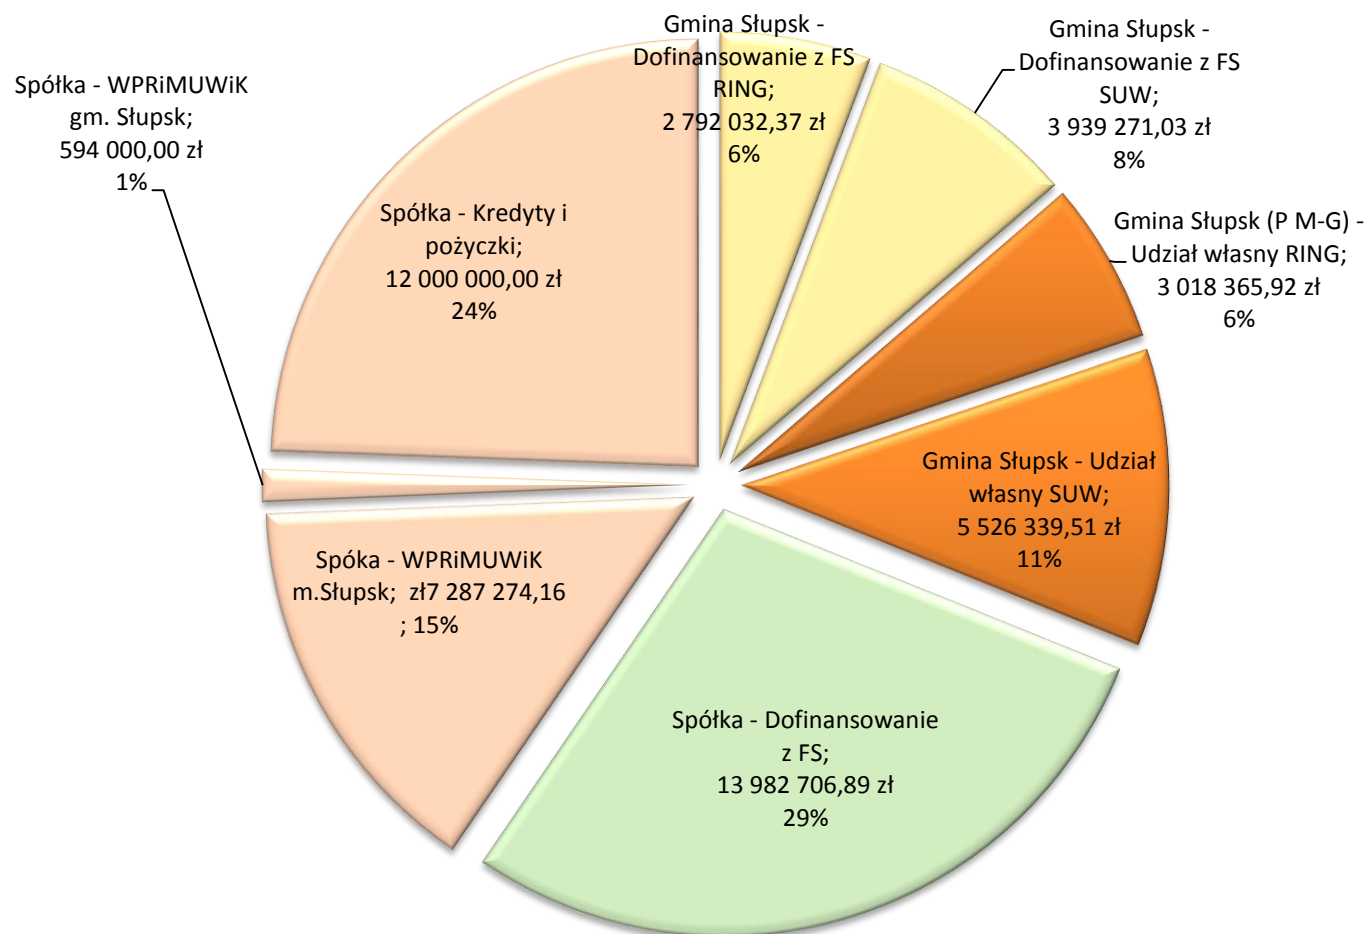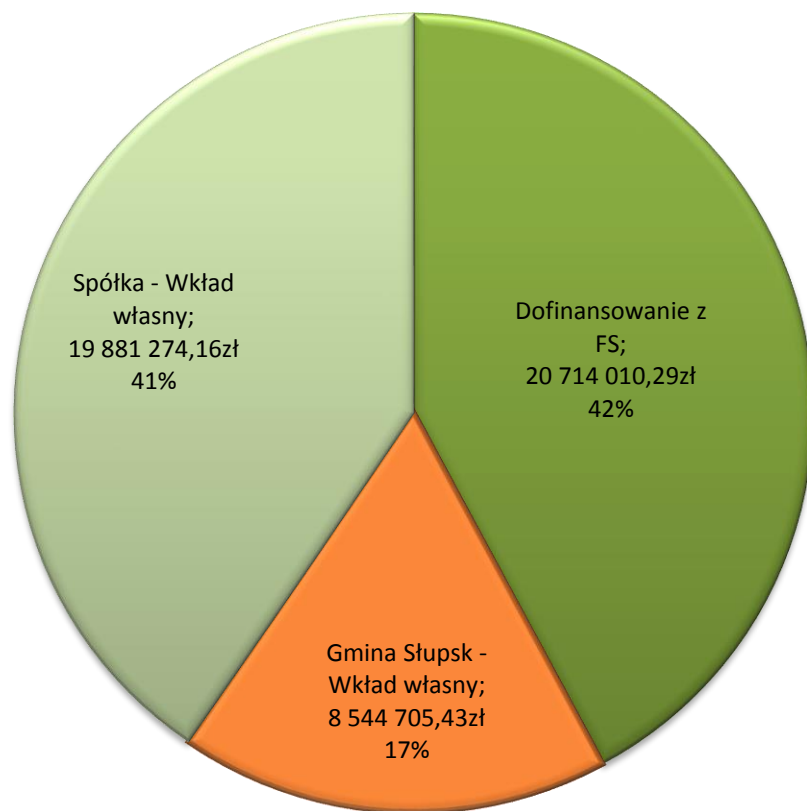

P M-G – podpisane porozumienie międzygminne regulujące współudział finansowy w budowie ringu kanalizacyjnego
WPRiMUWiK – wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

REALIZOWANE OBIEKTY



- Przebudowa sieci w ul. Szczecińskiej-Sobieskiego



- Budowa wodociągu w ul. Wiśniowej



- Budowa wodociągu w ul. Mieszka I

REALIZOWANE OBIEKTY

- Obiekt reaktora SBR - izolacje zewnętrzne


- Budowa 4 ZKF



- Nowy zbiornik biogazu

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

na dzień 31.10.2015 r. w odniesieniu do podpisanych kontraktów ujętych w umowie

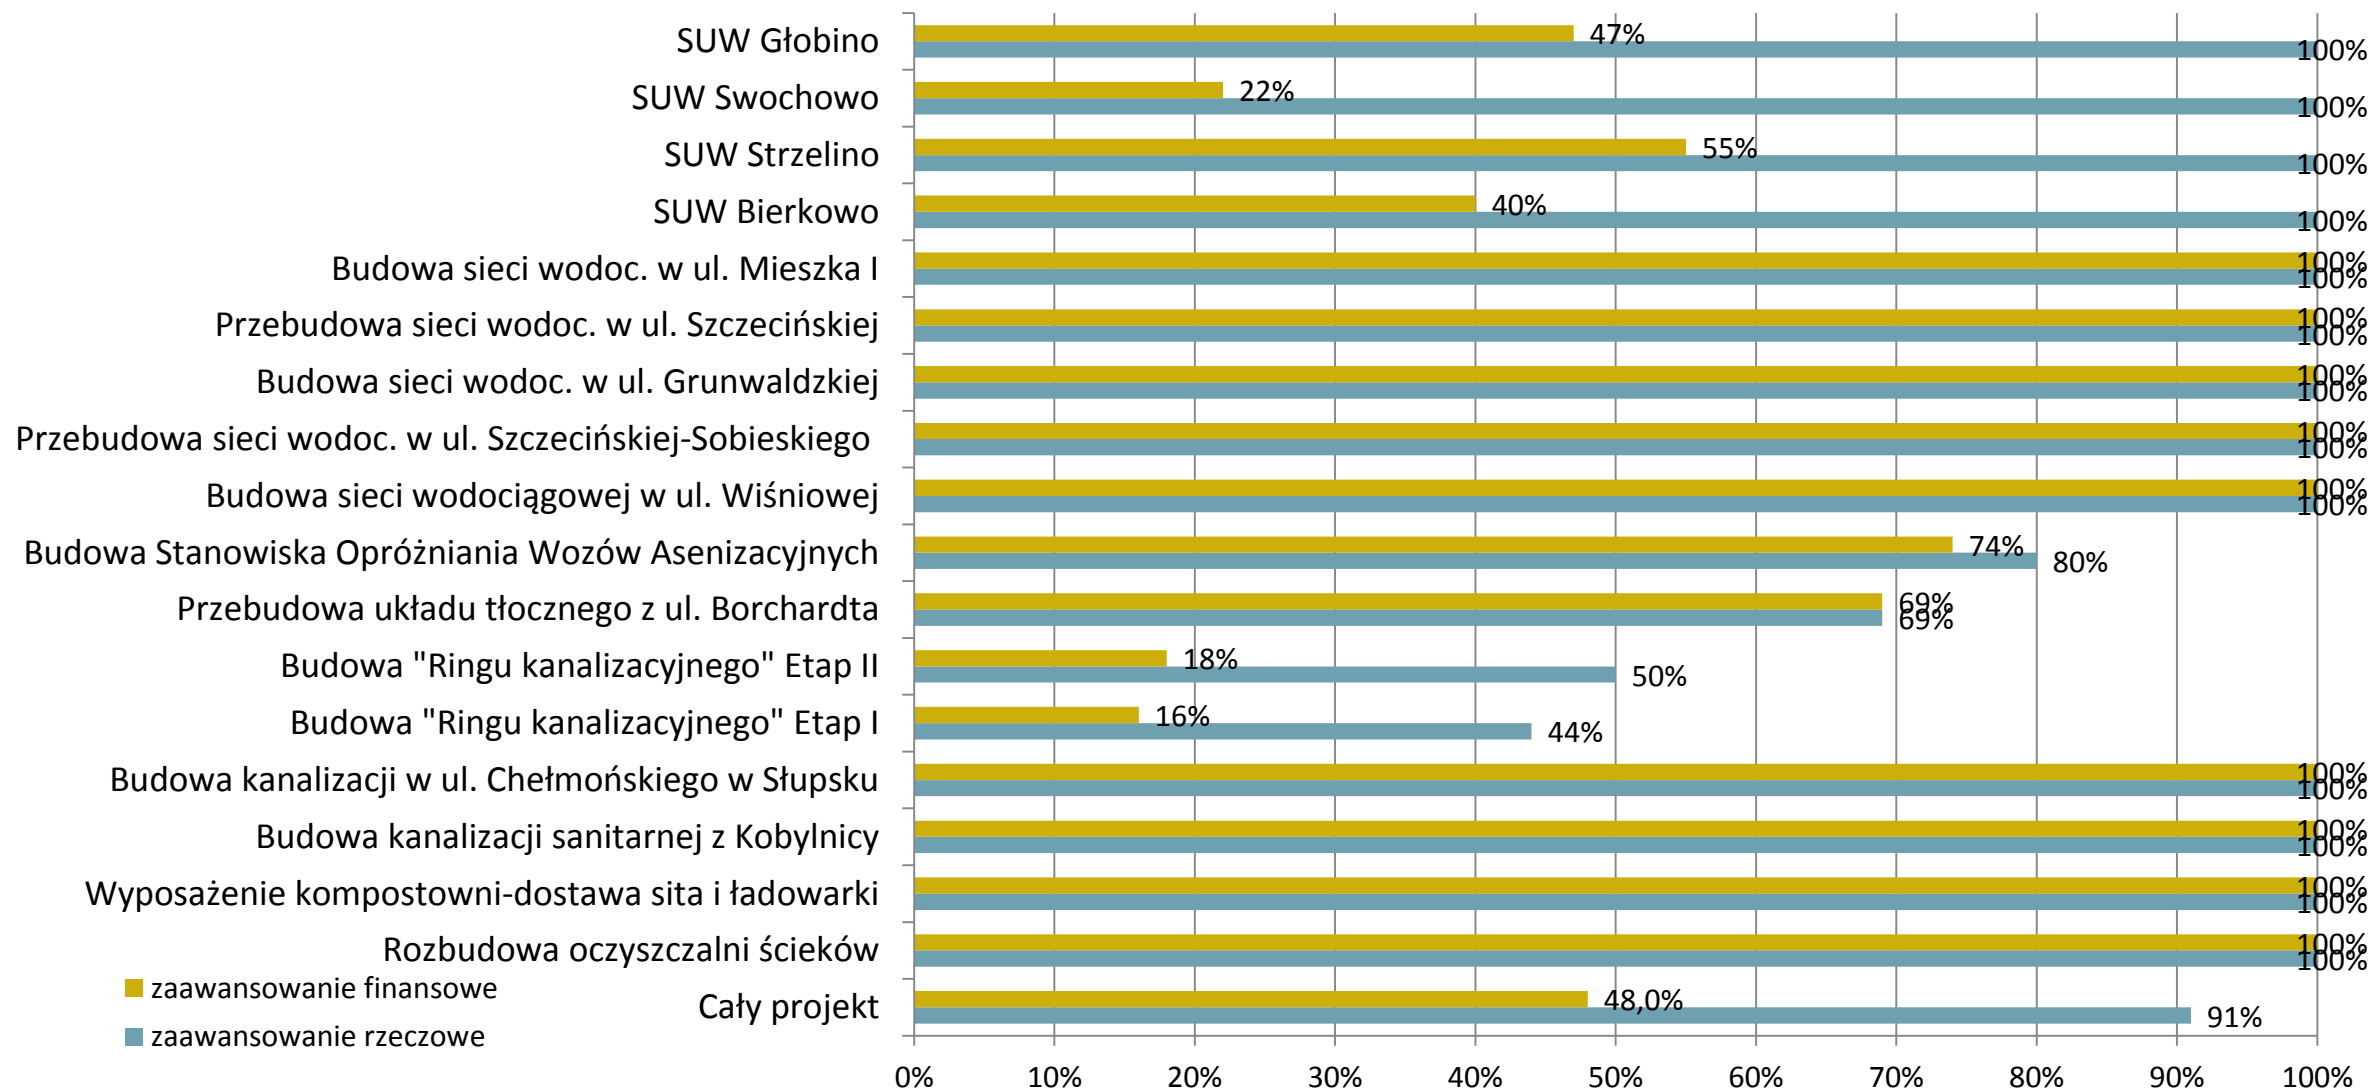

PODSUMOWANIE

- Pozytywne wyniki kontroli Projektu,
- Realizacja Projektu jest w fazie końcowej,
- Zakończenie robót na kluczowych Kontraktach (RING, rozbudowa OS) może się nieznacznie opóźnić,
- Pomimo tego, pozyskanie maksymalnej kwoty środków z dofinansowania powinno nastąpić już w listopadzie 2015 r.
- Zakończenie robót do 30.03.2016 r i rozliczenie Projektu 30.06.2016 r. nie powinno być zagrożone,

• CZY ZDĄŻYMY?

• CZY POZYSKAMY MAX.
DOFINANSOWANIE?

• CZY ROZLICZYMY PROJEKT?

TAK!

Wartość Projektu	w tym wydatków kwalifikowanych	w tym Fundusz Spójności
48 615 327,11	24 107 524,45	20 491 395,78
Zaawansowanie finansowe Projektu na 31.10.2015r		
23 218 593,79	17 429 888,49	14 815 405,16
48%	72%	72%
