

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 01


Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (w trzech częściach)

Kontrakt nr 01/I/2006

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”

Realizacja części I Kontraktu została zakończona. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia dla robót w terminie umownym na dzień 02.04.2009r. Zamawiający prowadził próbną eksploatację. Wykonawca usuwa zgłoszone wady i usterki oraz prowadzi optymalizację procesów technologicznych. W ramach „Dnia Otwartego Spółki” teren oczyszczalni został udostępniony do zwiedzania mieszkańcom Słupska i okolic.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 99%.

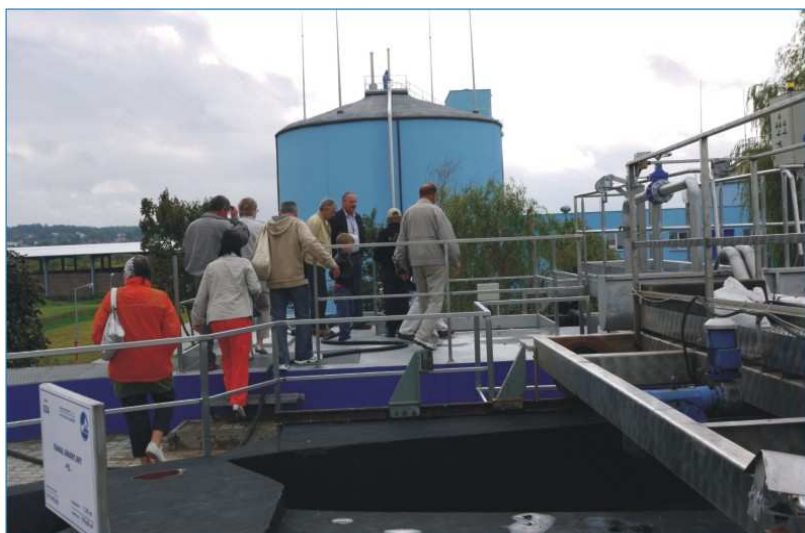

Dzień Otwarty Spółki – zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków (wrzesień 2009)

Kontrakt nr 01/II/2006**„Budowa głównego kolektora ściekowego”**

Realizacja części II Kontraktu przebiega niezgodnie z harmonogramem. Opóźnienia wynikają z winy Wykonawcy i dotyczą zarówno projektowania jak i realizacji robót na poszczególnych odcinkach. Uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich etapów robót obejmujących kontrakt. W chwili obecnej zakończone są wszystkie prace montażowe oraz związane z odtworzeniem terenu. Trwają prace związane z uruchomieniem automatyki pompowni oraz rozruch technologiczny urządzeń. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą dla poszczególnych zadań i wykonuje zalecenia oraz usterki zgłaszane w trakcie rozruchu.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 96%.

Kontrakt nr 01/III/2006**„Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”**

Realizacja części III Kontraktu przebiegała z opóźnieniem. Termin zakończenia kontraktu nie został dotrzymany. Rzeczywiste zakończenie robót w ramach kontraktu nastąpiło dnia 16.09.2009r. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 99,5%.



Kanał o średnicy 2 metrów odprowadzający ścieki z miasta do wybudowanej przepompowni ścieków na terenie bazy głównej „Wodociągów Słupsk” przy ul. Orzeszkowej 1.
